


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Octubre / 2017**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**


Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	14/11/2017		
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009		
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009		
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016		
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	205,520,000.00	Plazo de ejecución	89.74%		
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00	37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00	62.02%

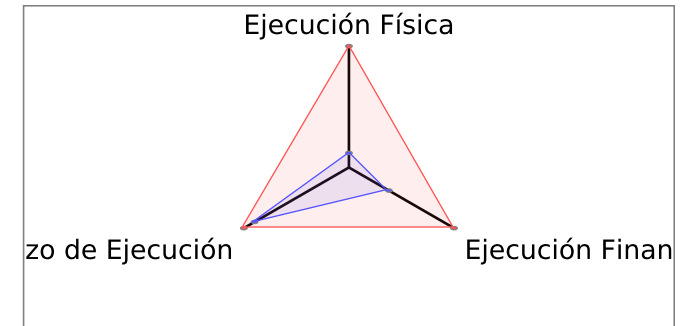

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	145,000,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 68.18%		
Presupuesto Devengado	3,371,095.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	82.16% / 82.16%		
Porcentaje de Ejecución	2.33%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecucion Actual	95.00%		
		Presupuesto planificado próximo	3,500,000.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.1818		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	187		347		174		708	
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados	Unidad	0		425	182	283		708	182
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Vehículo de doble tracción	Unidad	6		0		0		6	
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Módulo de estación de trabajo	Unidad	42		0		0		42	
Equipo de oficina	Unidad	1		1		0		2	
Servicio de consultoría	Unidad	42		0	9	0		42	9
Suministros de oficina	Unidad	1		1		0		2	
Combustible	Unidad	1		0		0		1	
Tabicación de estaciones de trabajo	Unidad	1		0		0		1	
Viaticos y gastos conexos	Unidad	1		0		0		1	
Servicio básico (Telefonía)	Unidad	1		0		0		1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión	Unidad	1		0		0		1	
Mantenimiento de vehículo	Unidad	1		0		0		1	
Seguro de vehículo	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	1		1		0		2	
Publicación de evento de licitación	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento de la infraestructura escolar.											
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados											
708 Módulos educativos	Licitación Pública Internacional	05/10/2016	05/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	06/12/2016	02/02/2017	13/12/2016	21/04/2017	20/12/2016	15/06/2017
577 Módulos educativos	Licitación Pública Internacional	16/02/2017	09/06/2017	17/02/2017	04/07/2017	28/04/2017		15/05/2017		08/06/2017	
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados											
708 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	08/11/2016	08/11/2016	05/12/2016	01/12/2016	22/02/2017	03/03/2017	08/03/2017	27/04/2017	04/04/2017	15/06/2017
577 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	23/03/2017		24/03/2017		05/06/2017		06/07/2017		26/07/2017	
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Vehículo de doble tracción											
Vehículos de doble tracción	Licitación Pública Nacional	31/01/2017	19/06/2017	01/02/2017	04/07/2017	07/03/2017	04/09/2017	10/03/2017	07/09/2017	23/03/2017	23/10/2017
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		15/02/2017		20/02/2017		27/02/2017	
Módulo de estación de trabajo											
Módulos de estaciones de trabajo	Comparación de Precios	08/02/2017		09/02/2017		09/03/2017		14/03/2017		21/03/2017	
Equipo de oficina											
Equipo de oficina (Evento 1)	Comparación de Precios	03/02/2017		06/02/2017		06/03/2017		13/03/2017		20/03/2017	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Equipo de oficina (Evento 2)	Comparación de Precios	01/06/2017		02/06/2017		30/06/2017		07/07/2017		21/07/2017	
Servicio de consultoría											
Jefe Técnico	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Monitoreo y Seguimiento	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional Jurídico y Legal	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Apoyo para las Áreas Técnica-Administrativa	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Verificador de Campo	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	16/06/2017	17/02/2017	16/06/2017	17/02/2017	20/06/2017	07/03/2017	26/07/2017
Suministros de oficina											
Suministros de oficina (Evento 1)	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		15/02/2017		20/02/2017		27/02/2017	
Suministros de oficina (Evento 2)	Comparación de Precios	09/06/2017		12/06/2017		10/07/2017		17/07/2017		01/08/2017	
Combustible											
Combustible	Contratación Directa	15/02/2017		15/02/2017		15/02/2017		01/03/2017		01/03/2017	
Tabicación de estaciones de trabajo											
Tabicación de estaciones de trabajo	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		13/02/2017		16/02/2017		23/02/2017	
Viaticos y gastos conexos											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Viáticos y gastos conexos	Contratación Directa	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		31/03/2017		31/03/2017	
Servicio básico (Telefonía)											
Servicio de telefonía	Comparación de Precios	23/01/2017		21/02/2017		24/02/2017		28/02/2017		01/03/2017	
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión											
Arrendamiento de vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Mantenimiento de vehículo											
Mantenimiento de vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Seguro de vehículo											
Seguro para vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Equipo de cómputo											
Equipo de cómputo (Evento 1)	Comparación de Precios	23/01/2017		25/01/2017		24/02/2017		03/03/2017		17/03/2017	
Equipo de cómputo (Evento 2)	Comparación de Precios	24/04/2017		25/04/2017		24/05/2017		31/05/2017		28/06/2017	
Publicación de evento de licitación											
Servicio de publicación de eventos de licitación	Comparación de Precios	23/01/2017		23/01/2017		23/01/2017		30/01/2017		30/01/2017	

Ejecución Financiera Anual


Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la infraestructura escolar.													
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados													
708 Módulos educativos	0.00	0.00	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	20,020,000.00	5,005,000.00	5,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100,000.00
577 Módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,000.00	4,081,000.00	24,486,000.00	0.00	32,648,000.00
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados													
708 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,664.10	0.00	2,566,664.10	2,566,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
577 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,664.10	2,566,664.10	0.00	5,133,328.20
Total componente	0.00	0.00	35,035,000.00	0.00	37,601,664.10	20,020,000.00	7,571,664.10	7,571,671.80	4,081,000.00	6,647,664.10	27,052,664.10	0.00	145,581,328.20
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros													
Vehículo de doble tracción													
Vehiculos de doble tracción	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00
Mobiliario de oficina													
Mobiliario de oficina	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
Módulo de estación de trabajo													
Módulos de estaciones de trabajo	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00
Equipo de oficina													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Equipo de oficina (Evento 1)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
Equipo de oficina (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
Servicio de consultoría													
Jefe Técnico	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Monitoreo y Seguimiento	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional Jurídico y Legal	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Infraestructura	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Apoyo para las Áreas Técnica-Administrativa	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional Contable Financiero	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Adquisiciones	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Verificador de Campo	0.00	0.00	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	6,771,996.00
Suministros de oficina													
Suministros de oficina (Evento 1)	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
Suministros de oficina (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
Combustible													
Combustible	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
Tabicación de estaciones de trabajo													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Tabicación de estaciones de trabajo	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Viaticos y gastos conexos													
Viáticos y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	2,887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,500.00
Servicio básico (Telefonía)													
Servicio de telefonía	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión													
Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
Mantenimiento de vehículo													
Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00
Seguro de vehículo													
Seguro para vehículos	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
Equipo de cómputo													
Equipo de cómputo (Evento 1)	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Equipo de cómputo (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Publicación de evento de licitación													
Servicio de publicación de eventos de licitación	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00
Total componente	0.00	500,500.00	2,338,936.60	5,553,686.60	856,686.60	856,686.60	1,183,936.60	902,886.60	856,686.60	856,686.60	856,686.60	856,686.60	15,620,066.00

Total	0.00	500,500.00	37,373,936.60	5,553,686.60	38,458,350.70	20,876,686.60	8,755,600.70	8,474,558.40	4,937,686.60	7,504,350.70	27,909,350.70	856,686.60	161,201,394.20
--------------	------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	----------------

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

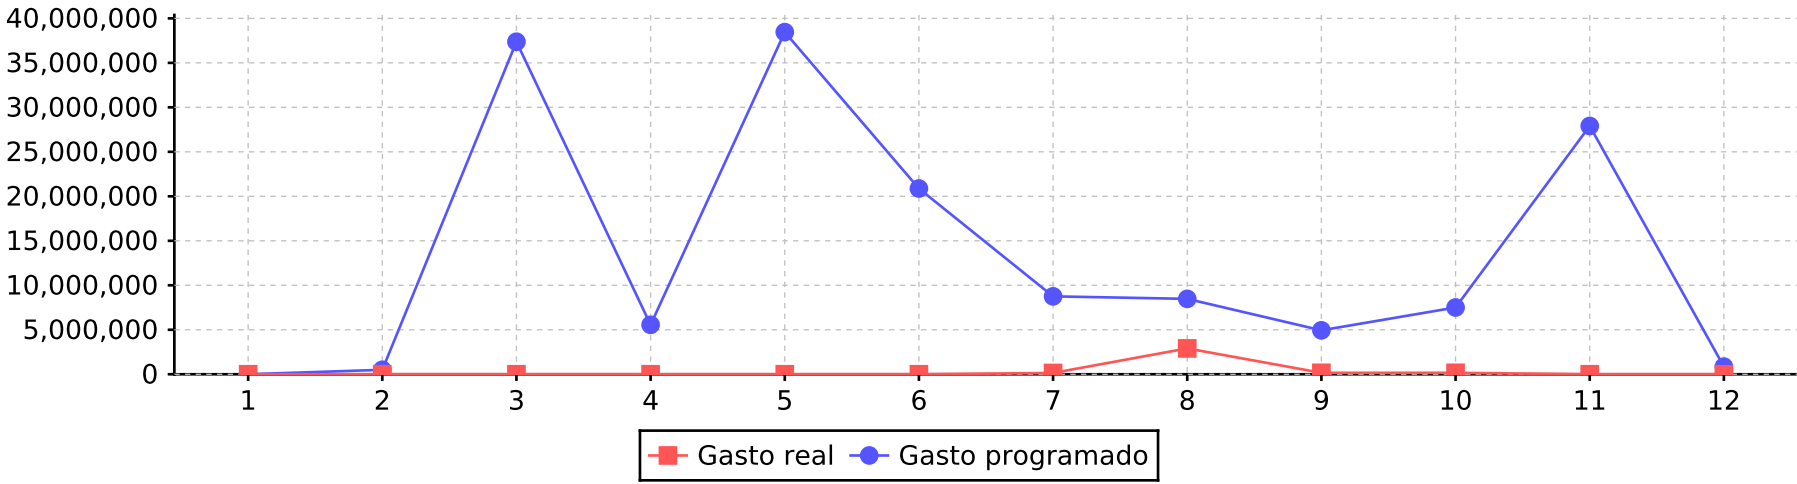

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	2,903,095.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	500,500.00	37,373,936.60	5,553,686.60	38,458,350.70	20,876,686.60	8,755,600.70	8,474,558.40	4,937,686.60	7,504,350.70	27,909,350.70	856,686.60
Total Gasto real	3,371,095.00											
Total Gasto programado	161,201,394.20											

Proyección de desembolsos



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progres.	476 días	lun 22/08/16	lun 16/07/18	lun 22/08/16	NOD	13%			\$29,400,000.00						s
Mejoramiento de la infraestructura escolar	476 días	lun 22/08/16	lun 16/07/18	lun 22/08/16	NOD	11%			\$28,764,866.00						s
1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	476 días	lun 22/08/16	lun 16/07/18	lun 22/08/16	NOD	50%			\$1,874,382.67						s
Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	309 días	lun 22/08/16	mar 14/11/17	lun 22/08/16	NOD	40%			\$1,373,876.65						s
Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00						s
Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00						s
Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	NOD	99%			\$0.00						s
Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 7/11/16	mar 30/08/16	lun 7/11/16	100%	5		\$0.00						s
Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 7/11/16	mar 8/11/16	lun 7/11/16	mar 8/11/16	100%	7		\$0.00						s
Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	20 días	mié 9/11/16	mar 6/12/16	NOD	NOD	0%	8		\$0.00						s
Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 8/11/16	mar 8/11/16	mar 8/11/16	mar 8/11/16	100%	8;9		\$0.00						s
Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 9/11/16	mar 15/11/16	mié 9/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00						s
Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00						s
Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00						s
NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00						s
Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 1/12/16	jue 1/12/16	jue 1/12/16	jue 1/12/16	100%	14		\$0.00						s
Preparación de Ofertas	25 días	vie 2/12/16	jue 12/01/17	vie 2/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00						s
Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8d		\$0.00						s
Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 9/01/17	lun 9/01/17	lun 9/01/17	lun 9/01/17	100%	15		\$0.00						s
Enmienda a Bases de Licitación	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	0%	16		\$0.00						s
Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16;18		\$0.00						s
Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	0%	20		\$0.00						s
Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20;21		\$0.00						s
Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	lun 2/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00						s
Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 2/03/17	vie 13/01/17	jue 2/03/17	100%	22		\$0.00						s
Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 3/03/17	mar 18/04/17	vie 3/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00						s
No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00						s
Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 4/05/17	vie 28/04/17	jue 4/05/17	100%	26		\$0.00						s
Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00						s
Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 7/06/17	jue 18/05/17	mié 7/06/17	100%	28		\$0.00						s
Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 8/06/17	jue 15/06/17	jue 8/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00						s
Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00						s
Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00						s
Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00						s
Orden de Compra	2 días	mar 18/07/17	mié 19/07/17	NOD	NOD	0%	32CC		\$0.00						s
Mobiliario (738) entregado y recepcionado	79 días	vie 21/07/17	mar 14/11/17	vie 21/07/17	NOD	12%			\$1,373,876.65						s
Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	79 días	vie 21/07/17	mar 14/11/17	vie 21/07/17	NOD	12%			\$1,373,876.65						s
Lote 1	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$200,637.88						s
Lote 2	41 días	vie 21/07/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	0%	32		\$146,841.68						s
Lote 3	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$165,079.41						s
Lote 4	41 días	vie 21/07/17	mié 20/09/17	NOD	NOD	0%	32		\$108,247.50						s
Lote 5	79 días	vie 21/07/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	32		\$164,278.22						s
Lote 6	57 días	vie 21/07/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	32		\$105,513.72						s
Lote 7	79 días	vie 21/07/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	32		\$229,189.84						s
Lote 8	57 días	vie 21/07/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	32		\$164,327.86						s
Lote 9	57 días	vie 21/07/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	32		\$89,760.54						s
Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general	30 días	lun 2/09/13	vie 11/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00						s
Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	361 días	mié 8/02/17	lun 16/07/18	mié 8/02/17	NOD	61%			\$500,506.02						s
1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	446 días	lun 22/08/16	lun 4/06/18	lun 22/08/16	NOD	7%			\$26,890,483.33						s
Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	384 días	lun 22/08/16	lun 5/03/18	lun 22/08/16	NOD	6%			\$16,011,920.60						s
Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00						s
Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00						s

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Pablo Fernando Godoy Reyes



Clara Medina
Subdirectora
de Cooperación Internacional

Aprobado por: (nombre y firma) Brenda Marleny Mayen Velásquez - Subdirectora
Ejecutiva FODES

Fecha de actualización

14/11/2017 - 8:35 AM
