

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	19/09/2018		
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009		
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009		
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016		
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	211,680,000.00	Plazo de ejecución	100.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00	37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00	62.02%

Gráfica de Ejecución

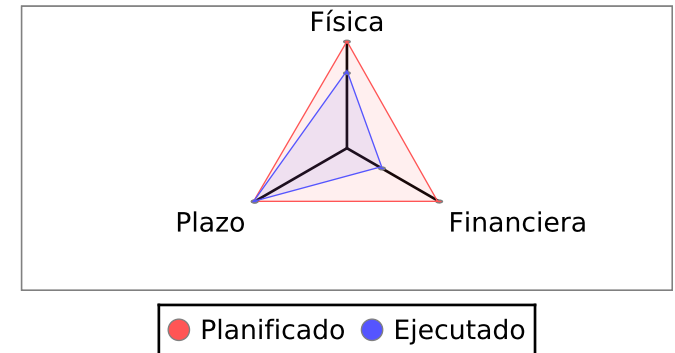

Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	18264390.02	Ejecución Financiera	65.00%
Presupuesto Vigente anual	183,469,027.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	105.18% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	118,324,534.19	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	63.15% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	64.49%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.3499		


Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082	265	0	460	0		1082	725
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Suministros de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	46		0		0		46	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018		19/02/2018		12/03/2018		13/03/2018		14/03/2018	
Suministros de oficina											
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	
Equipo de cómputo											
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

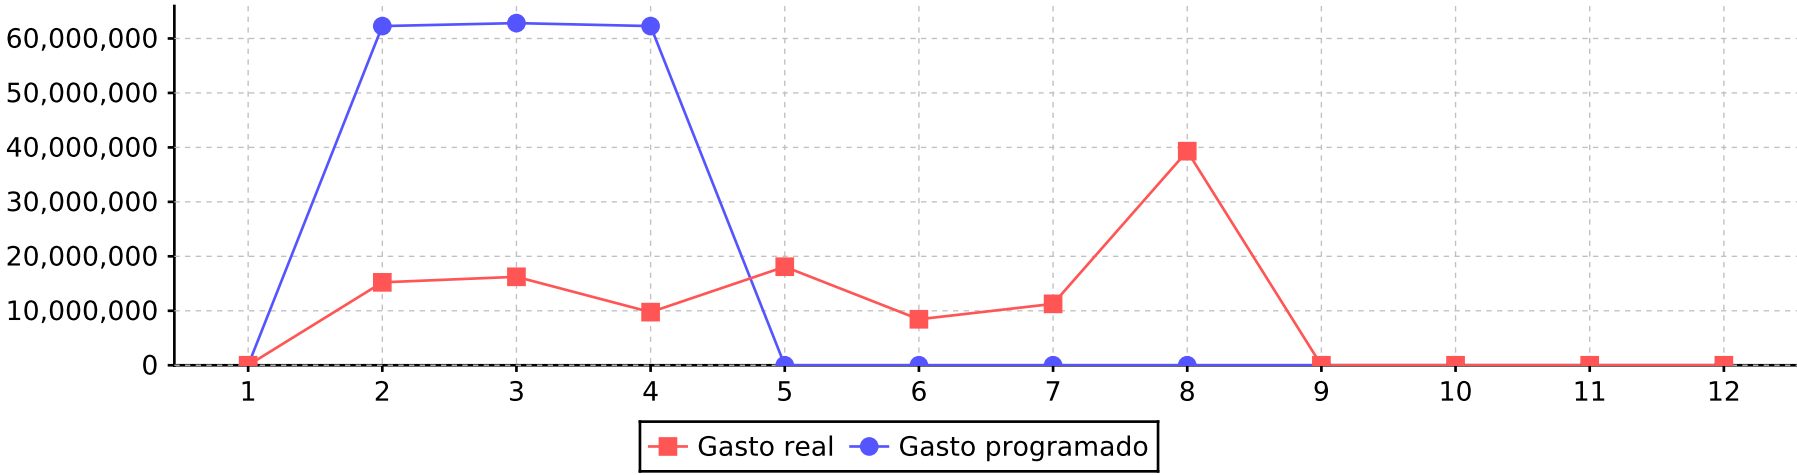

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	15,220,703.14	16,239,501.38	9,752,216.14	18,091,794.14	8,440,143.40	11,269,792.38	39,310,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												118,324,534.19
Total Gasto programado												187,379,418.44

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
1	PEP_SMART_2018_FODES	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$19,983,663.82		\$19,983,663.82				s
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$19,672,037.73		\$19,672,037.73				s
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				s
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				s
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
8	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				s
9	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				s
10	Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	20 días	mié 09/11/16	mar 06/12/16	NOD	NOD	0%	8		\$0.00		\$0.00				s
11	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				s
12	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				s
13	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				s
14	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				s
15	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				s
16	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				s
17	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
18	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
19	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
20	Enmienda a Bases de Licitación	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	0%	16		\$0.00		\$0.00				s
21	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				s
22	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	0%	20		\$0.00		\$0.00				s
23	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				s
24	Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	lun 02/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
25	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				s
26	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				s
27	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				s
28	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				s
29	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				s
30	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				s
31	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				s
32	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				s
33	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
34	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
35	Orden de Compra	2 días	mar 18/07/17	mié 19/07/17	NOD	NOD	0%	32CC		\$0.00		\$0.00				s
36	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				s
37	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				s
38	Lote 1	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	NOD	99%	32		\$206,104.63		\$206,104.63				s
39	Lote 2	24 días	vie 15/12/17	lun 22/01/18	vie 15/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$149,953.44		\$149,953.44				s
40	Lote 3	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	NOD	99%	32		\$169,577.30		\$169,577.30				s
41	Lote 4	20 días	jue 21/12/17	lun 22/01/18	jue 21/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$110,511.48		\$110,511.48				s
42	Lote 5	18 días	mar 26/12/17	lun 22/01/18	mar 26/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,659.58		\$167,659.58				s
43	Lote 6	17 días	vie 29/12/17	lun 22/01/18	vie 29/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$107,576.58		\$107,576.58				s
44	Lote 7	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$233,689.11		\$233,689.11				s
45	Lote 8	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,540.64		\$167,540.64				s
46	Lote 9	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$91,515.38		\$91,515.38				s
47	Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general	30 días	lun 02/09/13	vie 11/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
48	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
49	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
50	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
51	Proceso de Adquisición	150 días	mié 22/02/17	mar 26/09/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
52	Preparación de Bases de Licitación	104 días	mar 16/05/17	mié 11/10/17	mar 16/05/17	mié 11/10/17	100%	76		\$0.00		\$0.00				s
53	Aprobación Interna de Bases de Licitación	0 días	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	100%	78		\$0.00		\$0.00				s
54	-----Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	15 días	mié 22/02/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
55	Solicitud de No Objeción Bases de Licitación	2 días	vie 13/10/17	lun 16/10/17	vie 13/10/17	lun 16/10/17	100%	79		\$0.00		\$0.00				s
56	NOB DDLs	173 días	mié 22/02/17	lun 30/10/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
57	-----Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 17/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	81		\$0.00		\$0.00				s
58	-----Preparación de Ofertas	21 días	mié 18/10/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	83		\$0.00		\$0.00				s
59	-----Reunión aclaratoria	1 día	lun 06/11/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	84CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
60	-----Nombramiento del Comité de Evaluación	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	84CC+15 días		\$0.00		\$0.00				s
61	-----Enmienda	12 días	mar 07/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	85		\$0.00		\$0.00				s
62	-----Recepción de Ofertas	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	84,86		\$0.00		\$0.00				s
63	-----Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	88		\$0.00		\$0.00				s
64	-----Apertura de las Ofertas	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	88CC		\$0.00		\$0.00				s
65	-----Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	mié 22/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
66	-----Evaluación de las Ofertas	30 días	vie 01/12/17	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	88		\$0.00		\$0.00				s
67	-----Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	7 días	mié 17/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	92		\$0.00		\$0.00				s
68	-----No Objeción a la Adjudicación	7 días	vie 26/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	0%	93		\$0.00		\$0.00				s
69	-----Proceso de adjudicación	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	0%	94		\$0.00		\$0.00				s
70	-----Comunicación de la Adjudicación	7 días	mar 27/02/18	mié 07/03/18	NOD	NOD	0%	95		\$0.00		\$0.00				s
71	-----Delegación de firma	5 días	jue 08/03/18	mié 14/03/18	NOD	NOD	0%	96		\$0.00		\$0.00				s
72	-----Elaboración del Contrato	20 días	jue 08/03/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%	97CC		\$0.00		\$0.00				s
73	-----Gestión de firmas de contrato	10 días	jue 05/04/18	mié 18/04/18	NOD	NOD	0%	98		\$0.00		\$0.00				s
74	-----Emisión de Acuerdo Ministerial	10 días	jue 19/04/18	jue 03/05/18	NOD	NOD	0%	99		\$0.00		\$0.00				s
75	-----Notificación del Acuerdo	10 días	vie 04/05/18	jue 17/05/18	NOD	NOD	0%	100		\$0.00		\$0.00				s
76	-----Remisión de contratos firmados al BID	7 días	vie 18/05/18	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%	101		\$0.00		\$0.00				s
77	-----Orden de Compra	9 días	vie 04/05/18	mié 16/05/18	NOD	NOD	0%	101CC		\$0.00		\$0.00				s
78	-----Mobiliario (506) entregado y recepcionado	1237 días	lun 02/09/13	mié 11/07/18	NOD	NOD	0%			\$500,506.02		\$0.00				s
79	-----Empresa A	1237 días	lun 02/09/13	mié 11/07/18	NOD	NOD	0%			\$500,506.02		\$0.00				s
80	-----Primer pago	20 días	jue 17/05/18	mié 13/06/18	NOD	NOD	0%	103		\$250,253.01		\$0.00				s
81	-----Segundo Pago	20 días	jue 14/06/18	mié 11/07/18	NOD	NOD	0%	106		\$250,253.01		\$0.00				s
82	-----Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general	22 días	lun 02/09/13	mar 01/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
83	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$18,267,909.59		\$18,267,909.59				s
84	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	705 días	lun 22/08/16	dom 16/06/19	lun 22/08/16	dom 16/06/19	100%			\$15,653,975.26		\$15,653,975.26				s
85	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
86	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
87	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
88	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	112		\$0.00		\$0.00				s
89	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	114		\$0.00		\$0.00				s
90	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	115		\$0.00		\$0.00				s
91	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	116CC		\$0.00		\$0.00				s
92	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	117CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
93	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	116CC+7 días		\$0.00		\$0.00				s
94	-----Enmienda a Bases de Licitación	8 días	mié 07/12/16	jue 15/12/16	NOD	NOD	0%	117		\$0.00		\$0.00				s
95	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	117,119,120		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
96	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	44 días	jue 08/12/16	mar 14/02/17	NOD	NOD	0%	121		\$0.00		\$0.00				s
97	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	121CC,122		\$0.00		\$0.00				s
98	Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	jue 08/12/16	vie 16/12/16	NOD	NOD	0%	123		\$0.00		\$0.00				s
99	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	123,124		\$0.00		\$0.00				s
100	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	125		\$0.00		\$0.00				s
101	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	126		\$0.00		\$0.00				s
102	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	127		\$0.00		\$0.00				s
103	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	128		\$0.00		\$0.00				s
104	Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. - Empresa A	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$5,057,534.68		\$5,057,534.68				s
105	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
106	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	131		\$0.00		\$0.00				s
107	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	132		\$0.00		\$0.00				s
108	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	133		\$0.00		\$0.00				s
109	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				s
110	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	135		\$0.00		\$0.00				s
111	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				s
112	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del- NEC	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%	137		\$0.00		\$0.00				s
113	Ejecución financiera de módulos	216 días	jue 19/10/17	lun 27/08/18	jue 19/10/17	lun 27/08/18	100%			\$5,057,534.68		\$5,057,534.68				s
114	Ejecución física de módulos	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
115	Modulos Educativos Lote 1	343 días	mié 18/01/17	vie 25/05/18	mié 18/01/17	vie 25/05/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
116	Modulos Educativos Lote 8	448 días	lun 28/08/17	mar 11/06/19	lun 28/08/17	mar 11/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
117	Farex, S.A. - Empresa B	278 días	mar 16/05/17	mar 19/06/18	mar 16/05/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				s
118	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
119	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	976		\$0.00		\$0.00				s
120	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	977		\$0.00		\$0.00				s
121	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	978		\$0.00		\$0.00				s
122	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	979		\$0.00		\$0.00				s
123	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	980		\$0.00		\$0.00				s
124	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	979		\$0.00		\$0.00				s
125	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del- NEC	1 día	lun 17/07/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	0%	982		\$0.00		\$0.00				s
126	Ejecución financiera de módulos	129 días	jue 14/12/17	mar 19/06/18	jue 14/12/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				s
127	Ejecución física de módulos	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
128	Modulos Educativos Lote 2	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
129	Modulos Educativos Lote 7	110 días	lun 30/10/17	mié 04/04/18	lun 30/10/17	mié 04/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
130	Modulos Educativos Ciudad Peronia	52 días	vie 12/01/18	lun 26/03/18	vie 12/01/18	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
131	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C	523 días	mar 16/05/17	dom 16/06/19	mar 16/05/17	dom 16/06/19	100%			\$6,808,948.07		\$6,808,948.07				s
132	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
133	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1504		\$0.00		\$0.00				s
134	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1505		\$0.00		\$0.00				s
135	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1506		\$0.00		\$0.00				s
136	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1507		\$0.00		\$0.00				s
137	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1508		\$0.00		\$0.00				s
138	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1507		\$0.00		\$0.00				s
139	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del- NEC	1 día	jue 20/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	0%	1510		\$0.00		\$0.00				s
140	Ejecución financiera de módulos	219 días	mié 18/10/17	mar 28/08/18	mié 18/10/17	mar 28/08/18	100%			\$6,808,948.07		\$6,808,948.07				s
141	Ejecución física de módulos	437 días	lun 18/09/17	dom 16/06/19	lun 18/09/17	dom 16/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
142	Modulos Educativos Lote 3	217 días	mié 20/09/17	vie 27/07/18	mié 20/09/17	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
143	Modulos Educativos Lote 4	203 días	mar 10/10/17	vie 27/07/18	mar 10/10/17	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
144	Modulos Educativos Lote 5	437 días	lun 18/09/17	dom 16/06/19	lun 18/09/17	dom 16/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
145	Modulos Educativos Lote 6	181 días	vie 10/11/17	vie 27/07/18	vie 10/11/17	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
146	Modulos Educativos Lote 9	277 días	vie 20/04/18	vie 31/05/19	vie 20/04/18	vie 31/05/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
147	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	1286 días	dom 01/09/13	jue 20/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,613,934.33		\$2,613,934.33				s
148	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
149	Proceso de Adquisición	218 días	lun 15/05/17	lun 26/03/18	lun 15/05/17	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
150	Módulos instalados y recepcionados	1286 días	dom 01/09/13	jue 20/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,613,934.33		\$2,613,934.33				s
151	Farex, S.A. - Empresa A	118 días	jue 05/04/18	jue 20/09/18	jue 05/04/18	jue 20/09/18	100%			\$2,613,934.33		\$2,613,934.33				s
152	Ejecución financiera de módulos	82 días	vie 25/05/18	jue 20/09/18	vie 25/05/18	jue 20/09/18	100%			\$2,613,934.33		\$2,613,934.33				s
153	Ejecución física de módulos	80 días	jue 05/04/18	vie 27/07/18	jue 05/04/18	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
154	Módulos Educativos - Lote 4	49 días	dom 20/05/18	vie 27/07/18	dom 20/05/18	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
155	Módulos Educativos - Lote 6	80 días	jue 05/04/18	vie 27/07/18	jue 05/04/18	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
156	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
157	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
158	Administración UE	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$311,626.09		\$311,626.09				s
159	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
160	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
161	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
162	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
163	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
164	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
165	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	jue 17/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
166	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
167	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
168	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
169	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,224.09		\$130,224.09				s
170	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
171	Causa: Poco conocimiento Riesgo-Trámites Engorrosos- Impacto: Atraso en fechas planificadas	20 días	jue 12/01/17	mié 08/02/17	NOD	NOD	0%	4229		\$0.00		\$0.00				s
172	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	42,294,230		\$0.00		\$0.00				s
173	Publicación / Invitación	5 días	vie 14/04/17	jue 20/04/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
174	Evaluación de postulantes	6 días	vie 09/06/17	vie 16/06/17	vie 09/06/17	vie 16/06/17	100%	4232		\$0.00		\$0.00				s
175	NOB a Evaluación	2 días	lun 19/06/17	mar 20/06/17	lun 19/06/17	mar 20/06/17	100%	4233		\$0.00		\$0.00				s
176	Gestión interna y firma de contrato	9 días	mié 21/06/17	lun 03/07/17	mié 21/06/17	lun 03/07/17	100%	4234		\$0.00		\$0.00				s
177	Pago mes Marzo	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	0%	4235		\$24,000.00		\$0.00				s
178	Pago Mes Abril	19 días	lun 31/07/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	0%	4236		\$24,000.00		\$0.00				s
179	Pago Mes Mayo	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	0%	4237		\$24,000.00		\$0.00				s
180	Pago Mes Junio	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	0%	4238		\$24,000.00		\$0.00				s
181	Pago Mes Julio	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	mar 04/07/17	vie 28/07/17	100%	4239		\$19,754.85		\$19,754.85				s
182	Pago Mes Agosto	22 días	lun 31/07/17	mié 30/08/17	lun 31/07/17	mié 30/08/17	100%	4240		\$22,230.64		\$22,230.64				s
183	Pago Mes Septiembre	21 días	jue 31/08/17	vie 29/09/17	jue 31/08/17	vie 29/09/17	100%	4241		\$22,042.69		\$22,042.69				s
184	Pago Mes Octubre	21 días	lun 02/10/17	mar 31/10/17	lun 02/10/17	mar 31/10/17	100%	4242		\$22,063.93		\$22,063.93				s
185	Pago Mes Noviembre	21 días	mié 01/11/17	mié 29/11/17	mié 01/11/17	mié 29/11/17	100%	4243		\$22,065.64		\$22,065.64				s
186	Pago Mes Diciembre	14 días	vie 01/12/17	vie 01/12/17	vie 01/12/17	mié 20/12/17	100%	4244		\$22,066.34		\$22,066.34				s
187	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$98,630.16		\$0.00				s
188	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	180 días	vie 31/03/17	vie 15/12/17	vie 31/03/17	vie 15/12/17	100%			\$181,402.00		\$181,402.00				s
189	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
190	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	4259		\$0.00		\$0.00				s
191	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	4260		\$0.00		\$0.00				s
192	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	4261		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
193	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	4262		\$0.00		\$0.00				s
194	Reunión aclaratoria	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%	4263CC+5 días		\$0.00		\$0.00				s
195	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	4263CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
196	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4263		\$0.00		\$0.00				s
197	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4266CC		\$0.00		\$0.00				s
198	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	4266CC		\$0.00		\$0.00				s
199	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	4268		\$0.00		\$0.00				s
200	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	4269		\$0.00		\$0.00				s
201	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	4270		\$0.00		\$0.00				s
202	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	4271		\$0.00		\$0.00				s
203	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	4272		\$0.00		\$0.00				s
204	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	4273		\$0.00		\$0.00				s
205	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	4274		\$0.00		\$0.00				s
206	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	4275		\$0.00		\$0.00				s
207	Orden de Compra	1 día	mié 22/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	4276		\$0.00		\$0.00				s
208	Entrega de vehículo	17 días	jue 23/11/17	vie 15/12/17	jue 23/11/17	vie 15/12/17	100%	4277		\$181,402.00		\$181,402.00				s
209	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
210	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2017	37 días	jue 01/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	0%			\$4,000.00		\$0.00				s
211	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2018 para su utilización en actividades administrativas de la unidad ejecutora	61 días	mar 02/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$6,000.00		\$0.00				s
212	Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina	37 días	mié 10/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%			\$45,000.00		\$0.00				s
213	Proceso de Adquisición: Combustible	20 días	jue 01/06/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%			\$60,000.00		\$0.00				s
214	Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			\$5,136.99		\$0.00				s
215	Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el resguardo de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	vie 09/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	0%			\$30,000.00		\$0.00				s
216	Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	0%			\$25,000.00		\$0.00				s
217	Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo	35 días	mié 10/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$40,000.00		\$0.00				s
218	Monto pendiente de asignar	1 día	mié 04/04/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%			\$9,897.75		\$0.00				s

