


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Diciembre / 2017**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	11/01/2018
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	205,520,000.00	Plazo de ejecución	89.74%
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00 37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00 62.02%

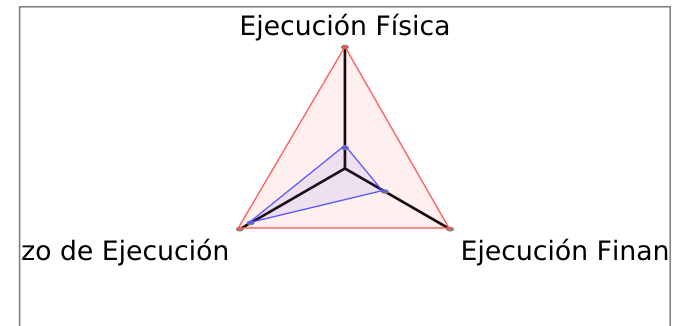

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	145,000,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	31,296,933.98	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	21.58%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	97.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	13.1818		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	187		347		174	118	708	118
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados	Unidad	0		425	182	283	556	708	738
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Vehículo de doble tracción	Unidad	6		0		0	6	6	6
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Módulo de estación de trabajo	Unidad	42		0		0		42	
Equipo de oficina	Unidad	1		1		0		2	
Servicio de consultoría	Unidad	42		0	9	0		42	9
Suministros de oficina	Unidad	1		1		0		2	
Combustible	Unidad	1		0		0		1	
Tabicación de estaciones de trabajo	Unidad	1		0		0		1	
Viaticos y gastos conexos	Unidad	1		0		0		1	
Servicio básico (Telefonía)	Unidad	1		0		0		1	

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión	Unidad	1		0		0		1	
Mantenimiento de vehículo	Unidad	1		0		0		1	
Seguro de vehículo	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	1		1		0		2	
Publicación de evento de licitación	Unidad	1		0		0		1	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Mejoramiento de la infraestructura escolar.											
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados											
708 Módulos educativos	Licitación Pública Internacional	05/10/2016	05/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	06/12/2016	02/02/2017	13/12/2016	21/04/2017	20/12/2016	15/06/2017
577 Módulos educativos	Licitación Pública Internacional	16/02/2017	09/06/2017	17/02/2017	04/07/2017	28/04/2017	30/11/2017	15/05/2017	01/12/2017	08/06/2017	20/12/2017
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados											
708 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	08/11/2016	08/11/2016	05/12/2016	01/12/2016	22/02/2017	03/03/2017	08/03/2017	27/04/2017	04/04/2017	15/06/2017
577 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	Licitación Pública Internacional	23/03/2017		24/03/2017		05/06/2017		06/07/2017		26/07/2017	
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Vehículo de doble tracción											
Vehículos de doble tracción	Licitación Pública Nacional	31/01/2017	19/06/2017	01/02/2017	04/07/2017	07/03/2017	04/09/2017	10/03/2017	07/09/2017	23/03/2017	23/10/2017
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		15/02/2017		20/02/2017		27/02/2017	
Módulo de estación de trabajo											
Módulos de estaciones de trabajo	Comparación de Precios	08/02/2017		09/02/2017		09/03/2017		14/03/2017		21/03/2017	
Equipo de oficina											
Equipo de oficina (Evento 1)	Comparación de Precios	03/02/2017		06/02/2017		06/03/2017		13/03/2017		20/03/2017	

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Equipo de oficina (Evento 2)	Comparación de Precios	01/06/2017		02/06/2017		30/06/2017		07/07/2017		21/07/2017	
Servicio de consultoría											
Jefe Técnico	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Monitoreo y Seguimiento	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional Jurídico y Legal	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Infraestructura	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Apoyo para las Áreas Técnica-Administrativa	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Profesional de Adquisiciones	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017		17/02/2017		17/02/2017		07/03/2017	
Verificador de Campo	Selección sobre la base la comparación de	20/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	16/06/2017	17/02/2017	16/06/2017	17/02/2017	20/06/2017	07/03/2017	26/07/2017
Suministros de oficina											
Suministros de oficina (Evento 1)	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		15/02/2017		20/02/2017		27/02/2017	
Suministros de oficina (Evento 2)	Comparación de Precios	09/06/2017		12/06/2017		10/07/2017		17/07/2017		01/08/2017	
Combustible											
Combustible	Contratación Directa	15/02/2017		15/02/2017		15/02/2017		01/03/2017		01/03/2017	
Tabicación de estaciones de trabajo											
Tabicación de estaciones de trabajo	Comparación de Precios	17/01/2017		18/01/2017		13/02/2017		16/02/2017		23/02/2017	
Viaticos y gastos conexos											

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Viáticos y gastos conexos	Contratación Directa	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		31/03/2017		31/03/2017	
Servicio básico (Telefonía)											
Servicio de telefonía	Comparación de Precios	23/01/2017		21/02/2017		24/02/2017		28/02/2017		01/03/2017	
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión											
Arrendamiento de vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Mantenimiento de vehículo											
Mantenimiento de vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Seguro de vehículo											
Seguro para vehículos	Comparación de Precios	23/03/2017		23/03/2017		23/03/2017		28/03/2017		28/03/2017	
Equipo de cómputo											
Equipo de cómputo (Evento 1)	Comparación de Precios	23/01/2017		25/01/2017		24/02/2017		03/03/2017		17/03/2017	
Equipo de cómputo (Evento 2)	Comparación de Precios	24/04/2017		25/04/2017		24/05/2017		31/05/2017		28/06/2017	
Publicación de evento de licitación											
Servicio de publicación de eventos de licitación	Comparación de Precios	23/01/2017		23/01/2017		23/01/2017		30/01/2017		30/01/2017	

Ejecución Financiera Anual


Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la infraestructura escolar.													
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados													
708 Módulos educativos	0.00	0.00	35,035,000.00	0.00	35,035,000.00	20,020,000.00	5,005,000.00	5,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100,000.00
577 Módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,000.00	4,081,000.00	24,486,000.00	0.00	32,648,000.00
1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados													
708 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,664.10	0.00	2,566,664.10	2,566,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
577 dotaciones de mobiliario para módulos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,664.10	2,566,664.10	0.00	5,133,328.20
Total componente	0.00	0.00	35,035,000.00	0.00	37,601,664.10	20,020,000.00	7,571,664.10	7,571,671.80	4,081,000.00	6,647,664.10	27,052,664.10	0.00	145,581,328.20
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros													
Vehículo de doble tracción													
Vehiculos de doble tracción	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00
Mobiliario de oficina													
Mobiliario de oficina	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00
Módulo de estación de trabajo													
Módulos de estaciones de trabajo	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00
Equipo de oficina													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Equipo de oficina (Evento 1)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
Equipo de oficina (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
Servicio de consultoría													
Jefe Técnico	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Monitoreo y Seguimiento	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional Jurídico y Legal	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Infraestructura	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Apoyo para las Áreas Técnica-Administrativa	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional Contable Financiero	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Profesional de Adquisiciones	0.00	0.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	25,641.00	256,410.00
Verificador de Campo	0.00	0.00	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	677,199.60	6,771,996.00
Suministros de oficina													
Suministros de oficina (Evento 1)	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
Suministros de oficina (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
Combustible													
Combustible	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
Tabicación de estaciones de trabajo													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Tabicación de estaciones de trabajo	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Viaticos y gastos conexos													
Viáticos y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	2,887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,500.00
Servicio básico (Telefonía)													
Servicio de telefonía	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión													
Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
Mantenimiento de vehículo													
Mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00
Seguro de vehículo													
Seguro para vehículos	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
Equipo de cómputo													
Equipo de cómputo (Evento 1)	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Equipo de cómputo (Evento 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
Publicación de evento de licitación													
Servicio de publicación de eventos de licitación	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00
Total componente	0.00	500,500.00	2,338,936.60	5,553,686.60	856,686.60	856,686.60	1,183,936.60	902,886.60	856,686.60	856,686.60	856,686.60	856,686.60	15,620,066.00

Total	0.00	500,500.00	37,373,936.60	5,553,686.60	38,458,350.70	20,876,686.60	8,755,600.70	8,474,558.40	4,937,686.60	7,504,350.70	27,909,350.70	856,686.60	161,201,394.20
--------------	------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	----------------

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

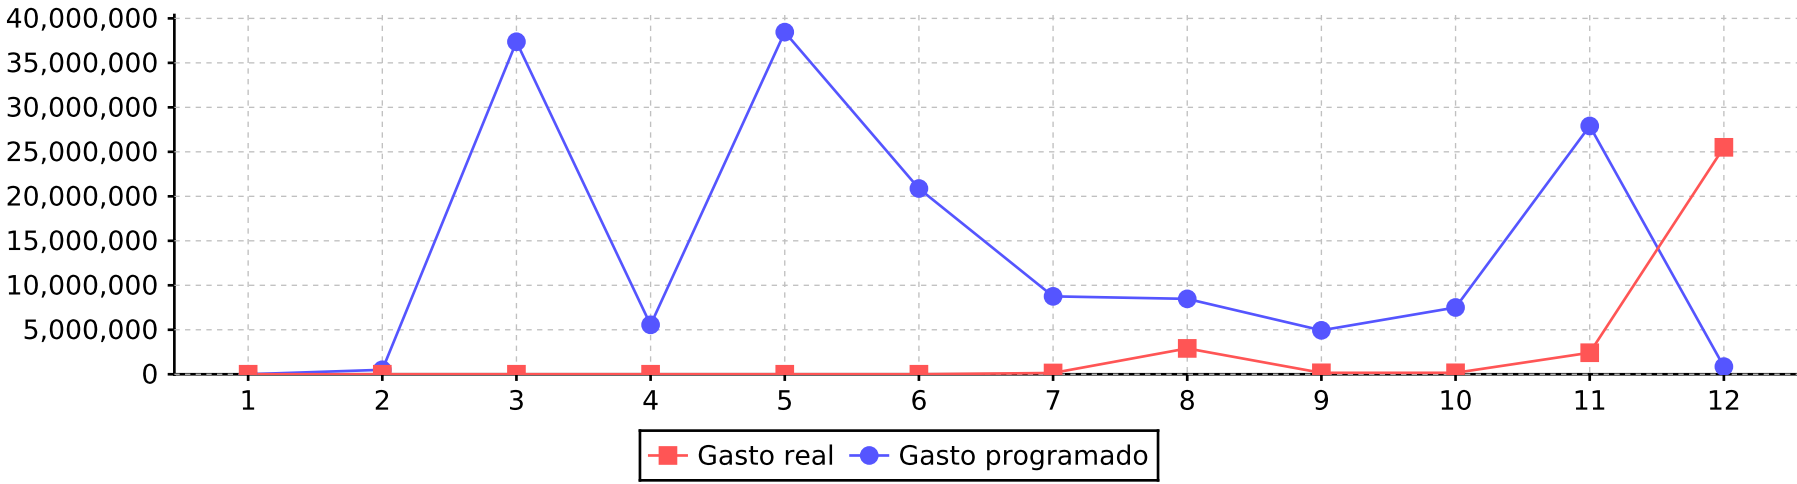

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	2,903,095.00	162,000.00	162,000.00	2,418,601.75	25,507,237.23
Gasto programado	0.00	500,500.00	37,373,936.60	5,553,686.60	38,458,350.70	20,876,686.60	8,755,600.70	8,474,558.40	4,937,686.60	7,504,350.70	27,909,350.70	856,686.60
Total Gasto real												31,296,933.98
Total Gasto programado												161,201,394.20

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1	Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa.	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	33%			\$29,302,827.86		\$4,266,371.92				s
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	31%			\$28,882,728.60		\$3,954,765.82				s
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
6	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
7	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				s
8	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				s
9	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				s
10	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				s
11	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				s
12	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				s
13	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				s
14	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				s
15	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
16	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
17	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
18	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				s
19	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				s
20	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				s
21	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				s
22	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				s
23	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				s
24	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				s
25	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				s
26	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				s
27	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				s
28	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
29	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
30	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
31	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
32	Lote 1	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$206,258.93		\$206,258.93				s
33	Lote 2	101 días	vie 21/07/17	jue 14/12/17	vie 21/07/17	jue 14/12/17	100%	32		\$150,011.18		\$150,011.18				s
34	Lote 3	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$169,704.26		\$169,704.26				s
35	Lote 4	106 días	vie 21/07/17	jue 21/12/17	vie 21/07/17	jue 21/12/17	100%	32		\$110,509.86		\$110,509.86				s
36	Lote 5	108 días	vie 21/07/17	mar 26/12/17	vie 21/07/17	mar 26/12/17	100%	32		\$167,651.78		\$167,651.78				s
37	Lote 6	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%	32		\$107,673.62		\$107,673.62				s
38	Lote 7	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$233,899.77		\$233,899.77				s
39	Lote 8	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$167,691.70		\$167,691.70				s
40	Lote 9	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$91,597.97		\$91,597.97				s
41	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
42	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	24%			\$27,477,729.53		\$2,549,766.75				s
43	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	383 días	lun 22/08/16	vie 02/03/18	lun 22/08/16	NOD	22%			\$16,359,517.45		\$2,549,766.75				s
44	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
45	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
46	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
47	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	85		\$0.00		\$0.00				s
48	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	87		\$0.00		\$0.00				s
49	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	88		\$0.00		\$0.00				s
50	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	89CC		\$0.00		\$0.00				s
51	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	90CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
52	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	89CC+7 días		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
53	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	90,92,93		\$0.00		\$0.00				s
54	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	94CC,95		\$0.00		\$0.00				s
55	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	96,97		\$0.00		\$0.00				s
56	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	98		\$0.00		\$0.00				s
57	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	99		\$0.00		\$0.00				s
58	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	100		\$0.00		\$0.00				s
59	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	101		\$0.00		\$0.00				s
60	Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. Empresa A	201 días	mar 16/05/17	vie 02/03/18	mar 16/05/17	NOD	20%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				s
61	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
62	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	104		\$0.00		\$0.00				s
63	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	105		\$0.00		\$0.00				s
64	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	106		\$0.00		\$0.00				s
65	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				s
66	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	108		\$0.00		\$0.00				s
67	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				s
68	Ejecución financiera de módulos	105 días	lun 02/10/17	vie 02/03/18	lun 02/10/17	NOD	4%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				s
69	Ejecución física de módulos	119 días	lun 28/08/17	vie 16/02/18	lun 28/08/17	NOD	21%			\$0.00		\$0.00				s
70	Farex - Farex, S.A. Empresa B	175 días	mar 16/05/17	jue 25/01/18	mar 16/05/17	NOD	42%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				s
71	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
72	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	895		\$0.00		\$0.00				s
73	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	896		\$0.00		\$0.00				s
74	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	897		\$0.00		\$0.00				s
75	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				s
76	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	899		\$0.00		\$0.00				s
77	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				s
78	Ejecución financiera de módulos	60 días	lun 30/10/17	jue 25/01/18	lun 30/10/17	NOD	1%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				s
79	Ejecución física de módulos	103 días	lun 21/08/17	jue 18/01/18	lun 21/08/17	NOD	46%			\$0.00		\$0.00				s
80	Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C	176 días	mar 16/05/17	vie 26/01/18	mar 16/05/17	NOD	8%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				s
81	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
82	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1599		\$0.00		\$0.00				s
83	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1600		\$0.00		\$0.00				s
84	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1601		\$0.00		\$0.00				s
85	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1602		\$0.00		\$0.00				s
86	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1603		\$0.00		\$0.00				s
87	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1602		\$0.00		\$0.00				s
88	Ejecución financiera de módulos	71 días	lun 16/10/17	vie 26/01/18	lun 16/10/17	NOD	11%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				s
89	Ejecución física de módulos	89 días	lun 18/09/17	jue 25/01/18	lun 18/09/17	NOD	6%			\$0.00		\$0.00				s
90	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	315 días	vie 10/02/17	mar 15/05/18	vie 10/02/17	NOD	69%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
91	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
92	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
93	Proceso de Adquisición	161 días	lun 15/05/17	vie 05/01/18	lun 15/05/17	NOD	93%			\$0.00		\$0.00				s
94	Preparación de Bases de Licitación y Aprobación Interna	8 días	lun 15/05/17	jue 25/05/17	lun 15/05/17	jue 25/05/17	100%	2835		\$0.00		\$0.00				s
95	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	9 días	vie 26/05/17	mié 07/06/17	vie 26/05/17	mié 07/06/17	100%	2837		\$0.00		\$0.00				s
96	No objeción a los Documentos de Licitación	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	jue 08/06/17	vie 09/06/17	100%	2839		\$0.00		\$0.00				s
97	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e Internacionales	17 días	lun 12/06/17	mar 04/07/17	lun 12/06/17	mar 04/07/17	100%	2840		\$0.00		\$0.00				s
98	Preparación de Ofertas	31 días	mar 04/07/17	dom 20/08/17	mar 04/07/17	dom 20/08/17	100%	2841		\$0.00		\$0.00				s
99	Reunión aclaratoria	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	100%	2841CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
100	Nombramiento del Comité de Evaluación	25 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	lun 26/06/17	lun 31/07/17	100%	2841CC+10 días		\$0.00		\$0.00				s
101	Recepción de Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	28,422,844		\$0.00		\$0.00				s
102	Apertura de las Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	2846CC		\$0.00		\$0.00				s


Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
103	Evaluación de las Ofertas	37 días	mar 22/08/17	dom 15/10/17	mar 22/08/17	dom 15/10/17	100%	2848		\$0.00		\$0.00				S
104	Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	100%	2850		\$0.00		\$0.00				S
105	No Objeción a la Adjudicación	16 días	mar 17/10/17	mar 07/11/17	mar 17/10/17	mar 07/11/17	100%	2851		\$0.00		\$0.00				S
106	Comunicación de la Adjudicación	18 días	mié 08/11/17	vie 01/12/17	mié 08/11/17	vie 01/12/17	100%	2852		\$0.00		\$0.00				S
107	Delegación de firma	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2853		\$0.00		\$0.00				S
108	Elaboración del Contrato	30 días	mié 08/11/17	mar 19/12/17	mié 08/11/17	mar 19/12/17	100%	2853CC		\$0.00		\$0.00				S
109	Gestión de firmas de contrato	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	2855		\$0.00		\$0.00				S
110	Emisión de Acuerdo Ministerial	5 días	jue 21/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2856		\$0.00		\$0.00				S
111	Notificación del Acuerdo	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2857		\$0.00		\$0.00				S
112	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	vie 05/01/18	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	2858		\$0.00		\$0.00				S
113	Orden de Compra o Contrato	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2858CC		\$0.00		\$0.00				S
114	Módulos instalados y recepcionados	90 días	vie 05/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				S
115	Empresa A	90 días	vie 05/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				S
116	Ejecución física de módulos	87 días	vie 05/01/18	jue 10/05/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
117	Primer entrega de módulos	18 días	vie 05/01/18	mar 30/01/18	NOD	NOD	0%	2860		\$0.00		\$0.00				S
118	Segunda entrega de módulos	18 días	mié 31/01/18	vie 23/02/18	NOD	NOD	0%	2864		\$0.00		\$0.00				S
119	Tercer entrega de módulos	17 días	lun 26/02/18	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%	2865		\$0.00		\$0.00				S
120	Cuarta entrega de módulos	17 días	mié 21/03/18	lun 16/04/18	NOD	NOD	0%	2866		\$0.00		\$0.00				S
121	Quinta entrega de módulos	17 días	mar 17/04/18	jue 10/05/18	NOD	NOD	0%	2867		\$0.00		\$0.00				S
122	Ejecución financiera de módulos	72 días	mié 31/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				S
123	Primer pago	3 días	mié 31/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	2864		\$2,223,642.42		\$0.00				S
124	Segundo Pago	3 días	lun 26/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	0%	2865		\$2,223,642.42		\$0.00				S
125	Tercer pago	3 días	mié 21/03/18	vie 23/03/18	NOD	NOD	0%	2866		\$2,223,642.42		\$0.00				S
126	Cuarto pago	3 días	mar 17/04/18	jue 19/04/18	NOD	NOD	0%	2867		\$2,223,642.42		\$0.00				S
127	Quinto pago	3 días	vie 11/05/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%	2868		\$2,223,642.40		\$0.00				S
128	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
129	Administración UE	328 días	lun 09/01/17	vie 27/04/18	lun 09/01/17	NOD	67%			\$420,099.26		\$311,606.10				S
130	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
131	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
132	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
133	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
134	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
135	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
136	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	mar 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
137	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
138	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
139	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	129 días	lun 23/10/17	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$9,863.00		\$0.00				S
140	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,234.74		\$130,234.74				S
141	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
142	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	30,283,029		\$0.00		\$0.00				S
143	Evaluación de postulantes	6 días	vie 09/06/17	vie 16/06/17	vie 09/06/17	vie 16/06/17	100%	3031		\$0.00		\$0.00				S
144	NOB a Evaluación	2 días	lun 19/06/17	mar 20/06/17	lun 19/06/17	mar 20/06/17	100%	3032		\$0.00		\$0.00				S
145	Gestión interna y firma de contrato	9 días	mié 21/06/17	lun 03/07/17	mié 21/06/17	lun 03/07/17	100%	3033		\$0.00		\$0.00				S
146	Pago Mes Julio	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	mar 04/07/17	vie 28/07/17	100%	3038		\$19,753.60		\$19,753.60				S
147	Pago Mes Agosto	22 días	lun 31/07/17	mié 30/08/17	lun 31/07/17	mié 30/08/17	100%	3039		\$22,228.66		\$22,228.66				S
148	Pago Mes Septiembre	21 días	jue 31/08/17	sáb 30/09/17	jue 31/08/17	sáb 30/09/17	100%	3040		\$22,058.01		\$22,058.01				S
149	Pago Mes Octubre	21 días	lun 02/10/17	mar 31/10/17	lun 02/10/17	mar 31/10/17	100%	3041		\$22,062.70		\$22,062.70				S
150	Pago Mes Noviembre	21 días	mié 01/11/17	mié 29/11/17	mié 01/11/17	mié 29/11/17	100%	3042		\$22,065.49		\$22,065.49				S
151	Pago Mes Diciembre	14 días	vie 01/12/17	mié 20/12/17	vie 01/12/17	mié 20/12/17	100%	3043		\$22,066.28		\$22,066.28				S
152	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	129 días	lun 23/10/17	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$98,630.16		\$0.00				S
153	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	178 días	vie 31/03/17	mié 13/12/17	vie 31/03/17	mié 13/12/17	100%			\$181,371.36		\$181,371.36				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
154	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
155	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	3058		\$0.00		\$0.00				s
156	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	3059		\$0.00		\$0.00				s
157	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	3060		\$0.00		\$0.00				s
158	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	3061		\$0.00		\$0.00				s
159	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	3062CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
160	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3062		\$0.00		\$0.00				s
161	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3065CC		\$0.00		\$0.00				s
162	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	3065CC		\$0.00		\$0.00				s
163	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	3067		\$0.00		\$0.00				s
164	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	3068		\$0.00		\$0.00				s
165	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	3069		\$0.00		\$0.00				s
166	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	3070		\$0.00		\$0.00				s
167	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	3071		\$0.00		\$0.00				s
168	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	3072		\$0.00		\$0.00				s
169	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	3073		\$0.00		\$0.00				s
170	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	3074		\$0.00		\$0.00				s
171	Entrega de vehículo	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	jue 23/11/17	mié 13/12/17	100%	3076		\$181,371.36		\$181,371.36				s
172	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
173	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2017	27 días	jue 01/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	0%			\$4,000.00		\$0.00				s
174	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2018 para su utilización en actividades administrativas de la unidad ejecutora	61 días	mar 02/01/18	mar 27/03/18	NOD	NOD	0%			\$6,000.00		\$0.00				s
175	Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina	27 días	mié 10/01/18	jue 01/03/18	NOD	NOD	0%			\$45,000.00		\$0.00				s
176	Proceso de Adquisición: Combustible	30 días	jue 01/06/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%			\$60,000.00		\$0.00				s
177	Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			\$5,136.99		\$0.00				s
178	Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el resguardo de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	vie 09/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	0%			\$30,000.00		\$0.00				s
179	Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	0%			\$25,000.00		\$0.00				s
180	Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo	25 días	mié 10/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$40,000.00		\$0.00				s

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Pablo Fernando Godoy Reyes



Licda. Clara Medina
Subdirectora de Cooperación Internacional
-FODES-

Aprobado por: (nombre y firma) Brenda Marleny Mayén Velásquez - Subdirectora
Ejecutiva FODES

Fecha de actualización

11/1/2018 - 1:59 PM
